Correction exercice planification

Diagramme de Gantt
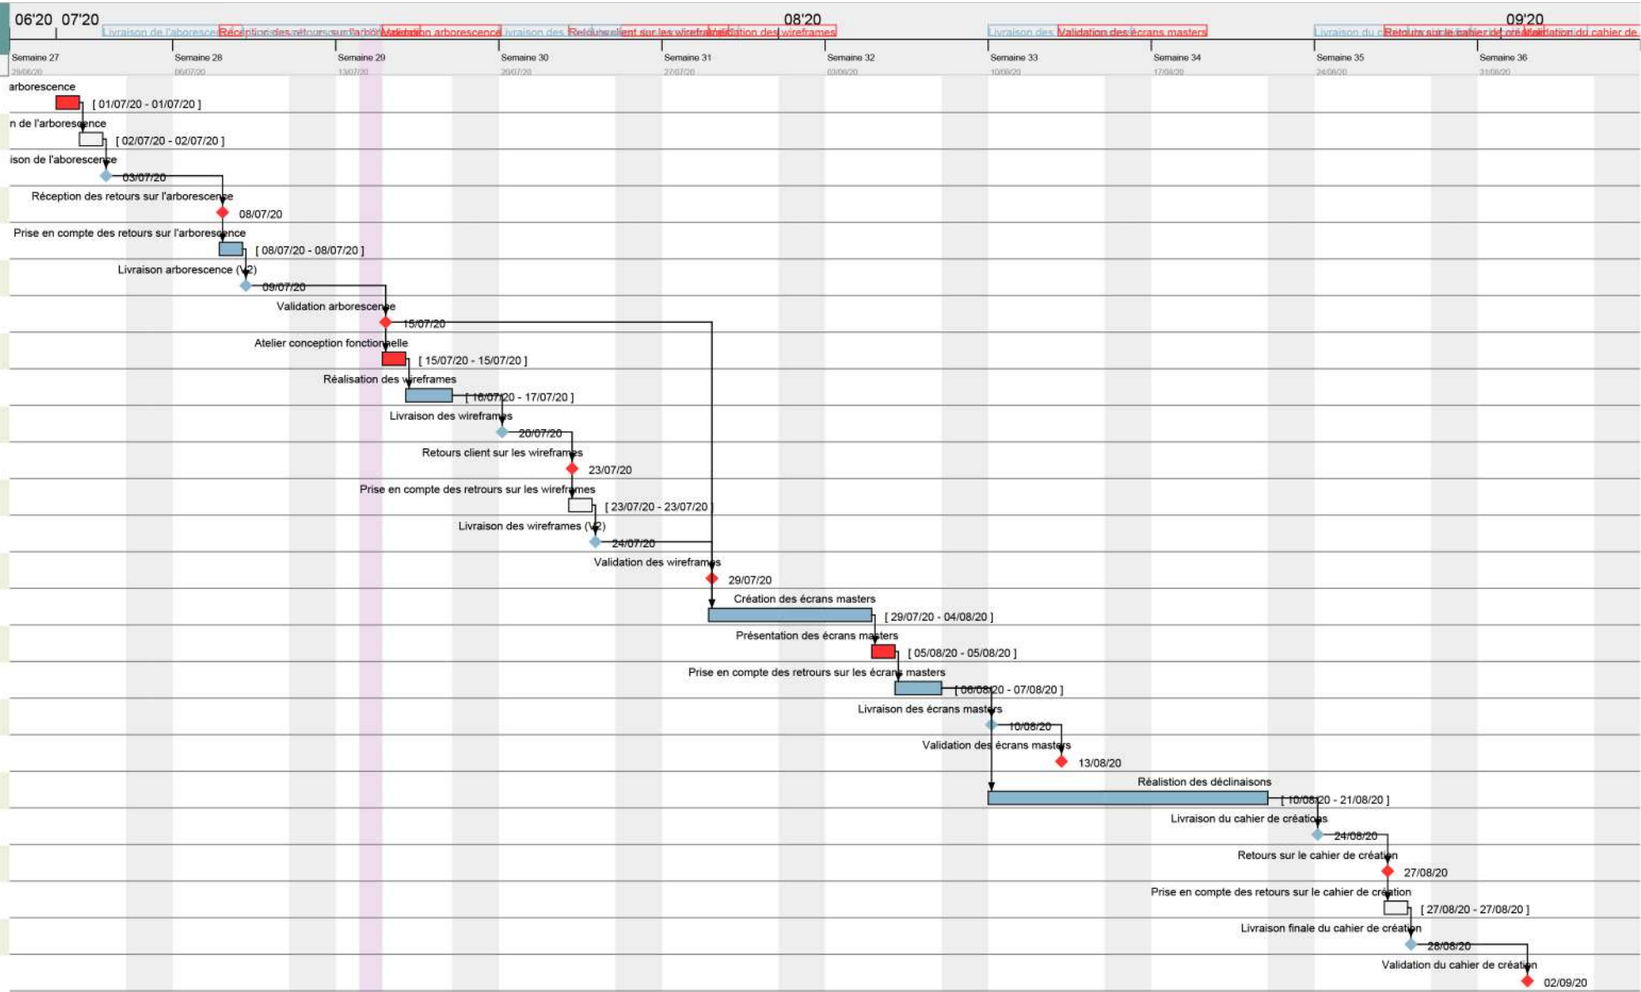
ID	Nom	Date de début	Date de fin	Durée	Prédécesseurs
0	Atelier arborescence	01/07/20	01/07/20	1	
3	Formalisation de l'arborescence	02/07/20	02/07/20	1	0
4	Livraison de l'aborescence	03/07/20	03/07/20	0	3
5	Réception des retours sur l'arborescence	08/07/20	08/07/20	0	4-FS=P3D
6	Prise en compte des retours sur l'arborescence	08/07/20	08/07/20	1	5
13	Livraison arborescence (V2)	09/07/20	09/07/20	0	6
14	Validation arborescence	15/07/20	15/07/20	0	13-FS=P3D
7	Atelier conception fonctionnelle	15/07/20	15/07/20	1	14
8	Réalisation des wireframes	16/07/20	17/07/20	2	7
9	Livraison des wireframes	20/07/20	20/07/20	0	8
10	Retours client sur les wireframes	23/07/20	23/07/20	0	9-FS=P3D
11	Prise en compte des retrours sur les wireframes	23/07/20	23/07/20	1	10
12	Livraison des wireframes (V2)	24/07/20	24/07/20	0	11
15	Validation des wireframes	29/07/20	29/07/20	0	12-FS=P3D
16	Création des écrans masters	29/07/20	04/08/20	5	14,15
17	Présentation des écrans masters	05/08/20	05/08/20	1	16
18	Prise en compte des retrours sur les écrans maste..	06/08/20	07/08/20	2	17
19	Livraison des écrans masters	10/08/20	10/08/20	0	18
20	Validation des écrans masters	13/08/20	13/08/20	0	19-FS=P3D
21	Réalistion des déclinaisons	10/08/20	21/08/20	10	18
22	Livraison du cahier de créations	24/08/20	24/08/20	0	21
23	Retours sur le cahier de création	27/08/20	27/08/20	0	22-FS=P3D
24	Prise en compte des retours sur le cahier de créati.	27/08/20	27/08/20	1	23
25	Livraison finale du cahier de création	28/08/20	28/08/20	0	24
26	Validation du cahier de création	02/09/20	02/09/20	0	25-FS=P3D
